



Липецкая
область



Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки

ДОУ №14 г. Липецка

2021



Составление паспорта проекта «Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки»





СОКОЛСАИД 14

Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Карточка проекта

СОГЛАСОВАНО

Председателем департамента образования администрации г. Липецка

Бедровой С. В.



УТВЕРЖДЕНО

заведующей ДОУ №14 г. Липецка

Н. Е. Дубовых



Название проекта: Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: педагогический совет ДОУ №14 г. Липецка.
2. Владелец процесса: ДОУ №14 г. Липецка.
3. Название процесса: подбор материала в электронной библиотеке для организации качественной образовательной деятельности.
4. Границы процесса: от запроса педагогического работника на ресурс до получения материала.
5. Руководитель проекта: заведующая ДОУ №14 г. Липецка Дубовых Н.Е.
6. Команда проекта: заместители заведующей Серёгина О.Ю. Сазонова Е.Н., Попова И.В., инструктор по физической культуре Полозова Н.С., музыкальные руководители Смольникова Т.Я., Гордеева М.Н.

2. Обоснование выбора

Проблемы:

- 1) Необходимость сокращения времени педагогов на поиск информационных и методических ресурсов при подготовке к образовательной деятельности.
- 2) Отсутствие систематизации имеющихся ресурсов и доступа к ним в электронной среде.

Риски:

- 1) Увеличение временных затрат сотрудников, задействованных в команде проекта.
- 2) Отсутствие экспертизы качества части образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет.

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение ВПП	1 час 30 минут	15 – 20 минут
2. Повышение доли педагогов ДОУ, использующих ресурсы электронной библиотеки при подготовке к образовательной деятельности	35%	95%

Эффекты:

1. Высвобождение времени педагогов для работы с детьми.
2. Повышение качества образовательной деятельности за счет повышения качества методического обеспечения образовательного процесса.

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: октябрь 2021 г.
2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: ноябрь 2021 г.
3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: ноябрь 2021 г.
4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: декабрь 2021 г.;
5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): декабрь 2021 г.
6. Реализация плана мероприятий: январь - февраль 2022 г.
7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: март 2022 г.
8. Закрытие проекта: март 2022 г.
9. Мониторинг стабильности результатов: март- апрель 2022 г.





Липецкая
область



2.Обоснование выбора

Ключевые риски: Увеличение временных затрат сотрудников, задействованных в команде проекта



Неудовлетворенность педагогов сроками подготовки к образовательной деятельности

Рост числа обращений педагогов к интернет ресурсам по подготовки к образовательной и воспитательной деятельности.

Отсутствие экспертизы качества части образовательных ресурсов, размещённых в сети Интернет.





СОКОЛСАИД14

Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



1. Вовлеченные лица и рамки проекта

1. Заказчик проекта: ДОУ №14 г. Липецка
2. Владелец проекта: заведующая ДОУ №14 г. Липецка
3. Название процесса: подбор материала в электронной библиотеке для организации качественной образовательной деятельности
4. Границы процесса: от запроса на ресурс до получения материала
5. Руководитель проекта: заведующая ДОУ №14 г. Липецка Н.Е. Дубовых
6. Команда проекта: заместители заведующей Серёгина О.Ю., Сазонова Е.Н., Попова И.В., инструктор по физической культуре Полозова Н.С., музыкальные руководители Смольникова Т.Я., Гордеева М.Н.



Липецкая
область



Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени по подготовке к образовательной деятельности	1 час 30 мин.	15-20 мин.
2. Повышение доли педагогов ДОУ использующих ресурсы электронной библиотеки при подготовке к образовательной деятельности	35%	95%

Эффекты

1. Высвобождение времени педагогов для работы с детьми
2. Повышение качества образовательной деятельности за счет повышения качества методического обеспечения образовательного процесса.



Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



4. Ключевые события проекта

№ п/п	Фазы и этапы проекта	Сроки
1.	Старт проекта. Разработка паспорта проекта.	октябрь 2021 г.
2.	Анализ текущей ситуации. Картирование процесса	ноябрь 2021 г.
3.	Разработка карты идеального и целевого состояния процесса.	ноябрь 2021 г.
4.	Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению.	декабрь 2021 г.
5.	Защита выработанных предложений по совершенствованию работы.	декабрь 2021 г.
6.	Реализация плана мероприятий.	январь- февраль 2022
7.	Стандартизация результатов.	март 2022 г.
8.	Закрытие проекта.	март 2022 г.
9.	Мониторинг стабильности результатов.	апрель 2022 г.



Шаг 2



Проведение замеров времени
по процессу подготовки
педагогических работников к
образовательной деятельности





Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Замеры времени по процессу - это фиксация замеров продолжительности выполняемых действий педагогов при подготовке к непосредственной образовательной деятельности

Кто картировал?

Команда проекта дошкольного образовательного учреждения детский сад №14г. Липецка.





Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Замеры времени по процессу

Замеры времени по процессу

Дата: _18.11.2021г.

Процесс: Подготовка педагога к образовательной деятельности.

Картировал: _Попова И.В. _____

Действия процесса	Время	Проблемы
1. Определение темы, цели и задач НОД.	5 мин.	
2. Определение применения методов и приемов НОД.	10 мин.	
3. Поиск материала с учетом возрастных особенностей детей, соответствие программе.	60 мин.	Сбой в сети интернет
4. Подготовка развивающей среды для НОД.	10 мин.	
5. Подбор динамических пауз	5 мин.	

Замеры времени по процессу

Дата: _10.11.2021г.

Процесс: Подготовка педагога к образовательной деятельности.

Картировал: _Попова И.В. _____

Действия процесса	Время	Проблемы
1. Определение темы, цели и задач НОД.	5 мин.	
2. Определение применения методов и приемов НОД.	15 мин.	
3. Поиск материала с учетом возрастных особенностей детей, соответствие программе.	50 мин.	Низкая скорость интернета
4. Подготовка развивающей среды для НОД.	10 мин.	
5. Подбор динамических пауз	5 мин.	Большой бумажный поток (картоотека на бумаге)






Карта текущего состояния процесса подготовки педагогических работников к образовательной деятельности

Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Карта текущего состояния

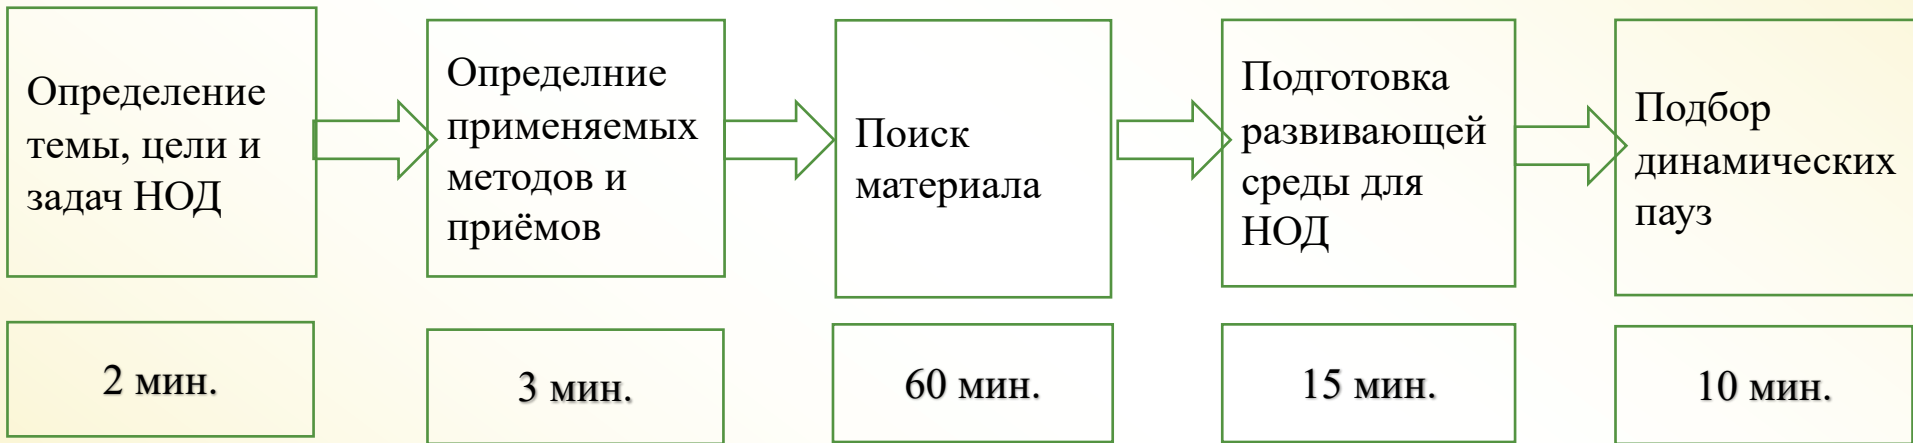

Время протекания процесса – 1 час 30 мин.





Шаг 4



Построение пирамиды
проблем в процессе подготовки
педагогических работников к
образовательной деятельности.



Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Пирамида проблем





Шаг 5



Поиск решения проблем процесса
подготовки педагогических
работников к образовательной
деятельности.





СОКОЛСАД14

Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Поиск решения проблем

Проблема	Первопричина	Способ решения
Педагог тратит много времени на поиск нужной информации при подготовке к образовательной деятельности	Большой поток информации	Создание электронной библиотеки
Необходимость подготовки педагога к разным видам образовательной деятельности		Систематизация материалов электронной библиотеки по образовательным областям и возрастам
Обязательная подготовка наглядного, демонстрационного и художественного материала к образовательной деятельности		Систематизация по видам деятельности

Липецкая область



Шаг 6



Карта идеального состояния процесса
подготовки педагогических
работников к образовательной
деятельности.






Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Карта идеального состояния

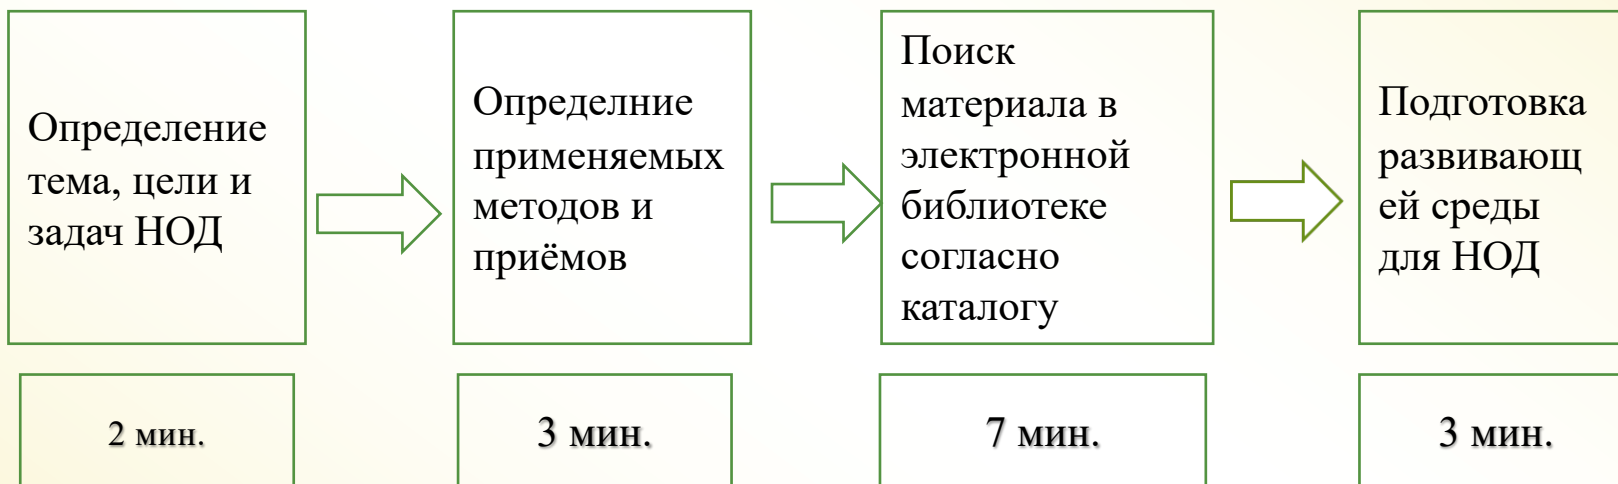

Время протекания процесса – 15 мин.






Карта целевого состояния процесса подготовки педагогических работников к образовательной деятельности.

Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Карта целевого состояния

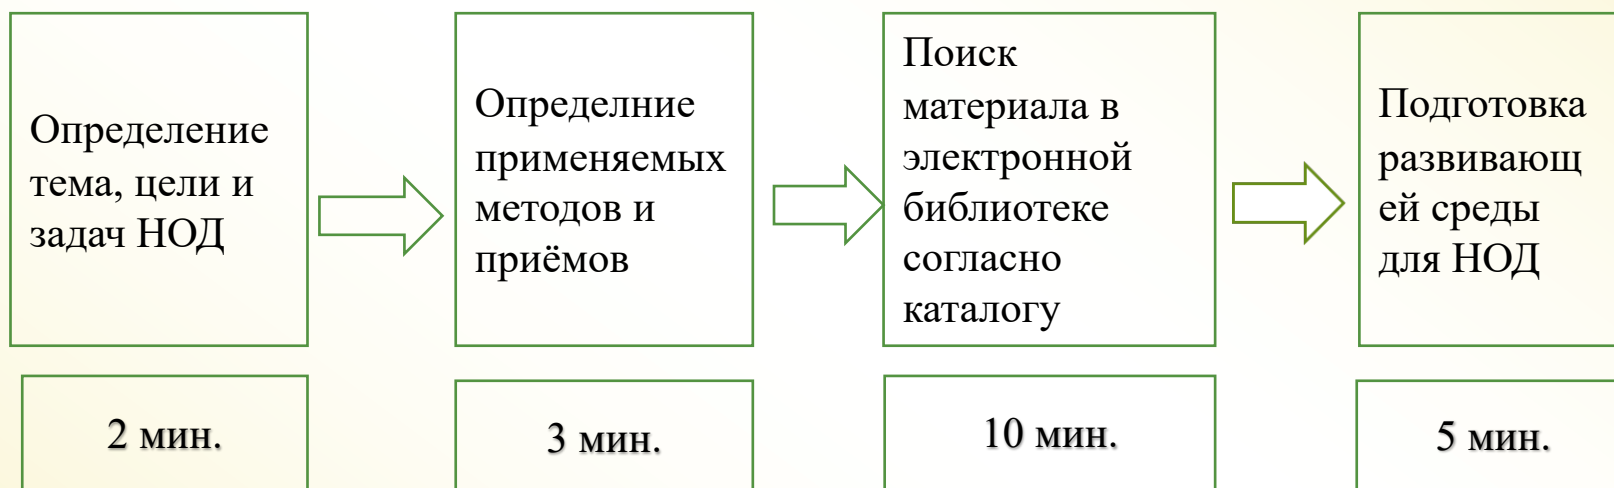

Время протекания процесса – 20 мин.



Шаг 8



Разработка плана мероприятий по
решению проблем процесса
подготовки педагогических
работников к образовательной
деятельности.



Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



СОКОЛСАИД14



Липецкая область



План мероприятий по реализации
проекта «Подготовка
педагогических работников к
образовательной деятельности с
использованием ресурсов
электронной библиотеки»





Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



№ п/п	Наименование мероприятия	Октябрь 2021	Ноябрь 2021	Декабрь 2021	Январь 2022	Февраль 2022	Март 2022	Апрель 2022г
1	Старт проекта. Разработка паспорта проекта.	■						
2	Анализ текущей ситуации. Картирование процесса.		■					
3	Разработка карты идеального и целевого состояния процесса.		■					
4	Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению.			■				
5	Защита выработанных предложений по совершенствованию (план мероприятий).			■				
6	Реализация плана мероприятий.				■	■		
7	Стандартизация результатов.						■	
8	Закрытие проекта.						■	
9	Мониторинг стабильности результатов.							■

Диаграмма Ганта



Липецкая область



Шаг 10



Стандартизация результатов процесса подготовки педагогических работников к образовательной деятельности





Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



Дата анализа	Время затраченное на		Расхождение (+; -)	Причина расхождения (+)
	План	Факт		
10.03.2022	20 минут	25 минут	+ 5 минут	Недостаточный опыт работы
14.03.2022	20 минут	40 минут	+ 20 минут	Низкая скорость интернета
22.03.2022	20 минут	25 минут	+ 5 минут	Недостаточный опыт работы





Шаг 10



Анализ эффективности процесса подготовки педагогических работников к образовательной деятельности





Подготовка педагогических работников к образовательной деятельности с использованием ресурсов электронной библиотеки



**Спасибо за
внимание!**

